

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

18/01/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Ιανουαρίου 1**



Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του πρώτου 15ημερου Ιανουαρίου 2021

(α) Προκατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

Την 12-01-2021, έγινε οπτικός έλεγχος συγκολλήσεων πυθμένα και ορίσθηκαν
σημεία (σταυροί) για λήψη ραδιογραφιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το
απόγευμα της ίδιας μέρας.

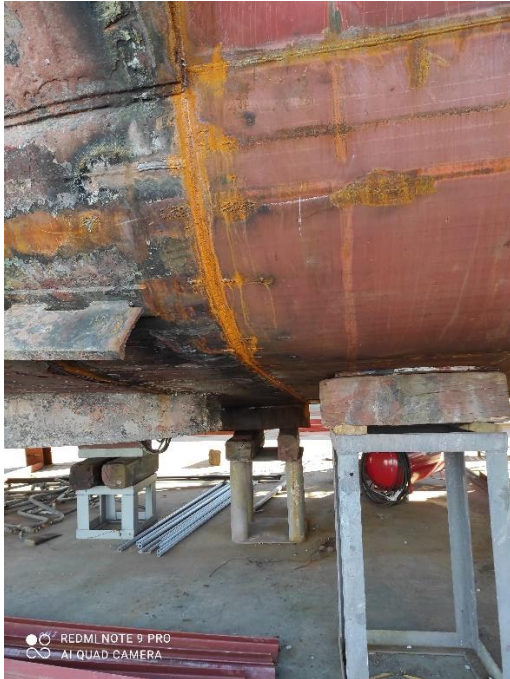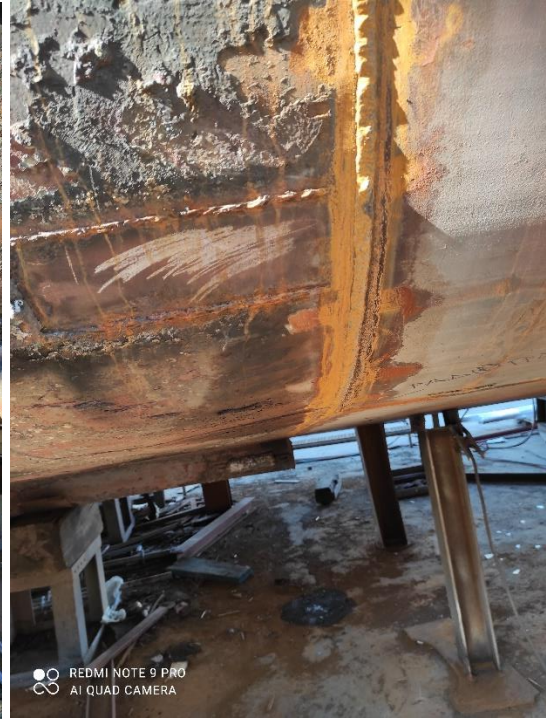

Την 14-01-2021, ξεκίνησε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons)





(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα


1- Κουζίνα


Την 13-01-2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες διευθέτησης της κουζίνας και τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτής.



2- Κλιμακοστάσιο γέφυρας



Έγιναν εργασίες διευθέτησης του νέου κλιμακοστασίου μεταξύ καταστρώματος και γεφύρας και τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτού

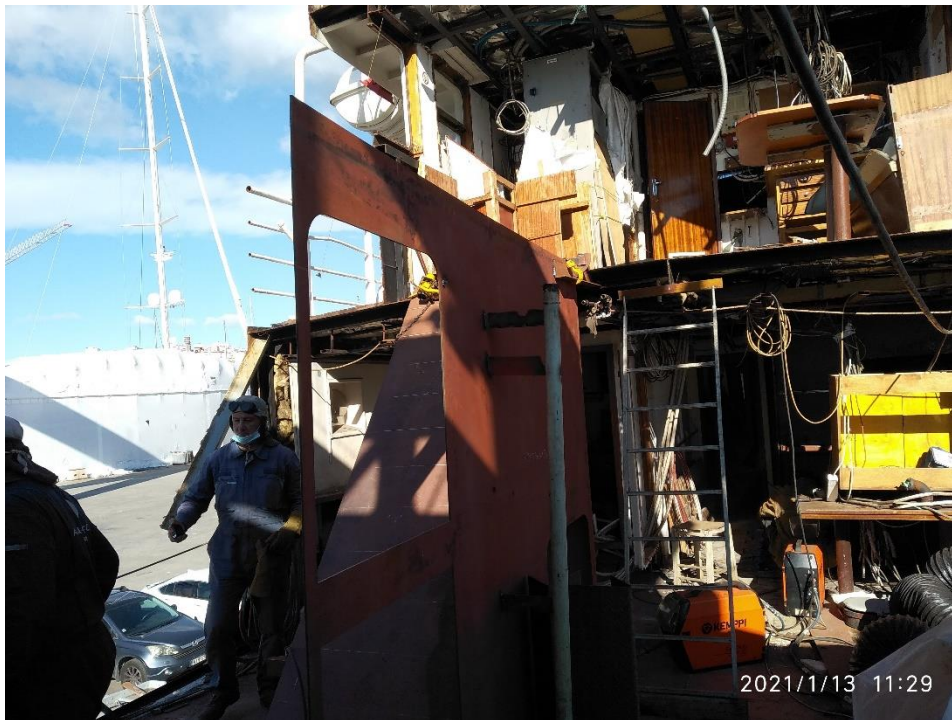

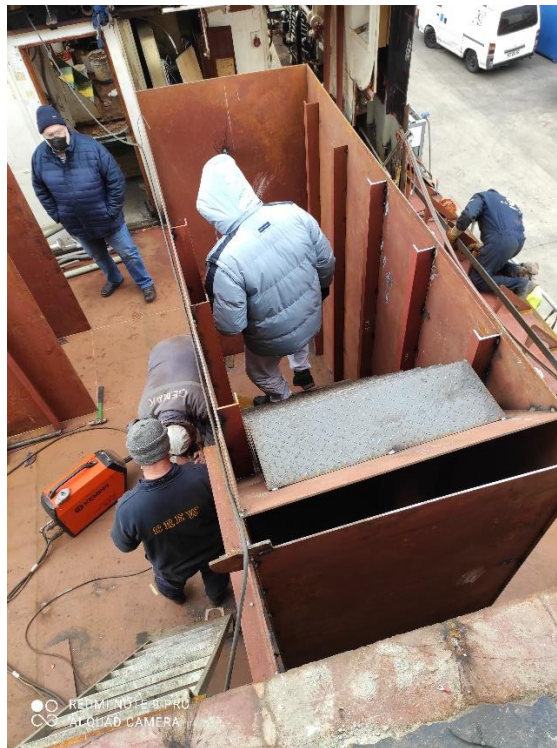


3- Κλιμακοστάσιο νέου τμήματος

Έγιναν εργασίες διευθέτησης του νέου κλιμακοστασίου μεταξύ καταστρώματος και χώρου νέων καμπινών γεφύρας και τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτού

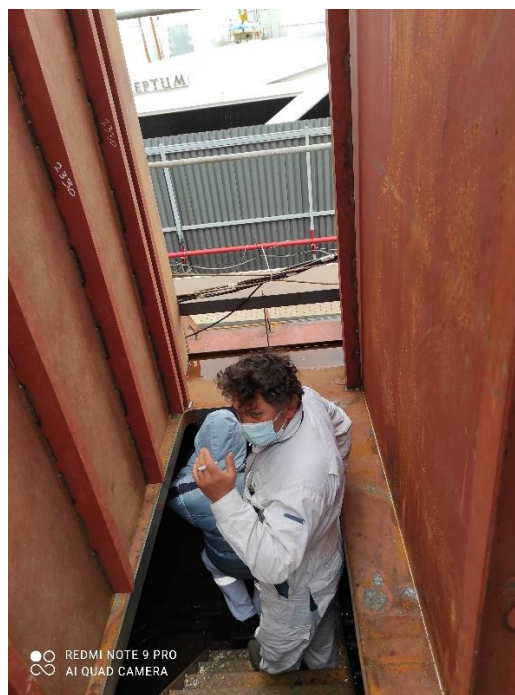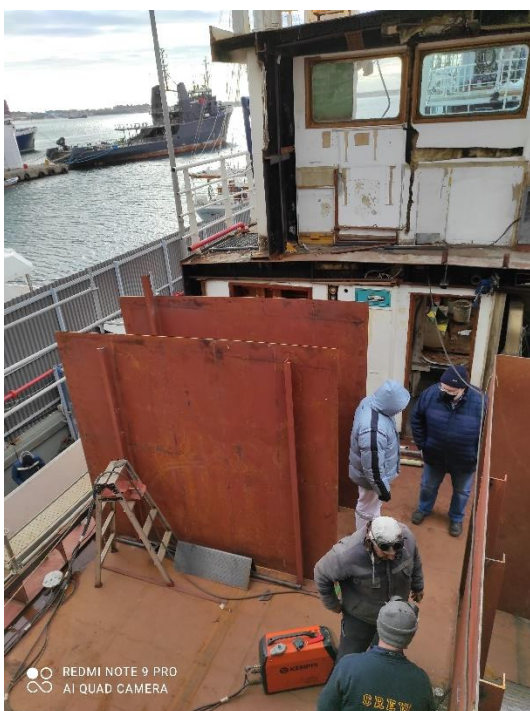

(γ) Εργασίες κάτω από το κύριο κατάστρωμα (χώρος νέου τμήματος)

Την 08-01-2021 τοποθετήθηκε η κλίμακα μεταξύ του χώρου νέων καμπινών και κυρίου καταστρώματος

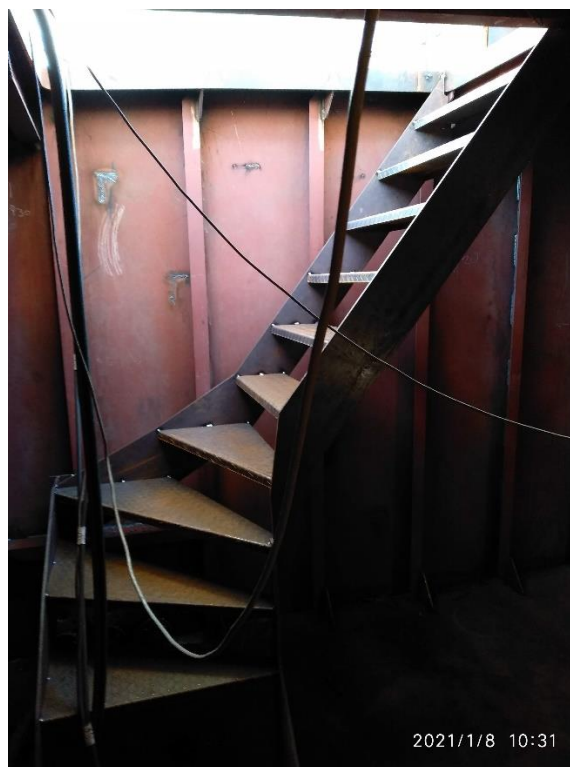

(δ) εργασίες αξονικών συστημάτων

Τα αξονικά συστήματα και οι προπέλλες αφού επιθεωρήθηκαν στο μηχανουργείο μεταφέρθηκαν και επανατοποθετήθηκαν στο πλοίο.



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ

Πειραιάς

5/02/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Ιανουαρίου 2021**


Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Ιανουαρίου 2021

(α) Κατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

Την 16-01-2021, συνεχίστηκε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons)

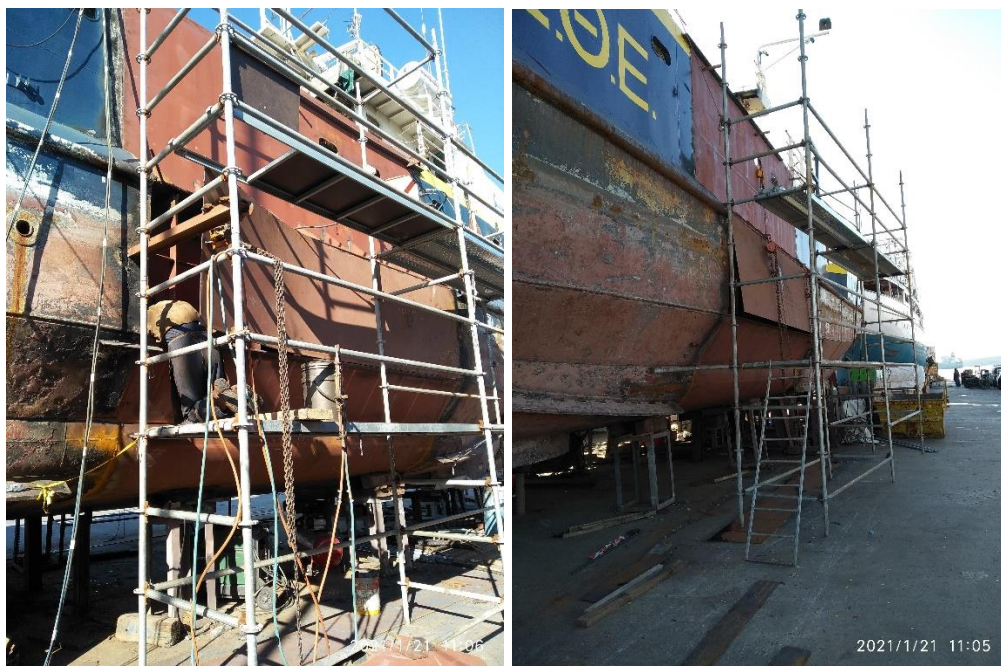

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα

1- Κουζίνα

Την 16-01-2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες διευθέτησης της κουζίνας και τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά (χαλύβδινα) όρια αυτής.



2- Κλιμακοστάσιο γέφυρας

Συμπληρώθηκε το νέο κλιμακοστάσιο μεταξύ καταστρώματος και γεφύρας και τοποθετήθηκαν οι μεταλλικές βαθμίδες (σκαλοπάτια)





3- Πλευρές υπερκατασκευής

Από 21-01-2021 μεταφέρθηκαν στο ναυπηγείο ελάσματα και ενισχυτικά των πλευρών της υπερκατασκευής του νέου τμήματος, συναρμολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν επί του πλοίου.



4.- Οροφή υπερκατασκευής

Από 26-01-2021 μεταφέρθηκαν στο ναυπηγείο ελάσματα και ενισχυτικά της οροφής της υπερκατασκευής του νέου τμήματος, συναρμολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν επί του πλοίου.

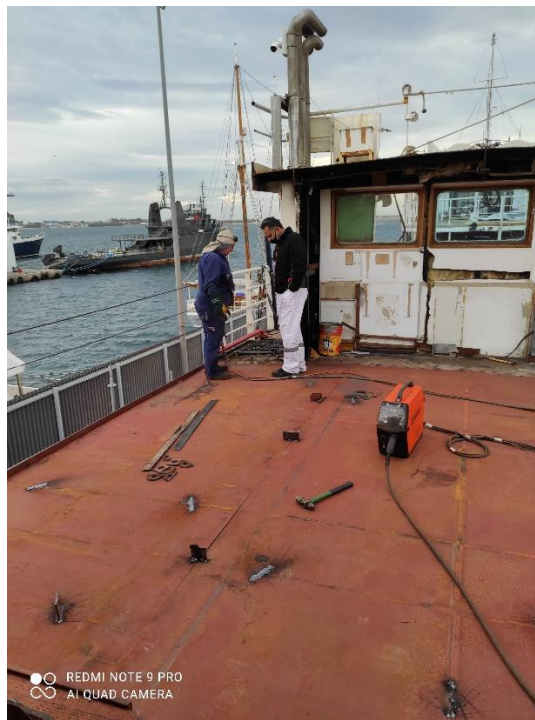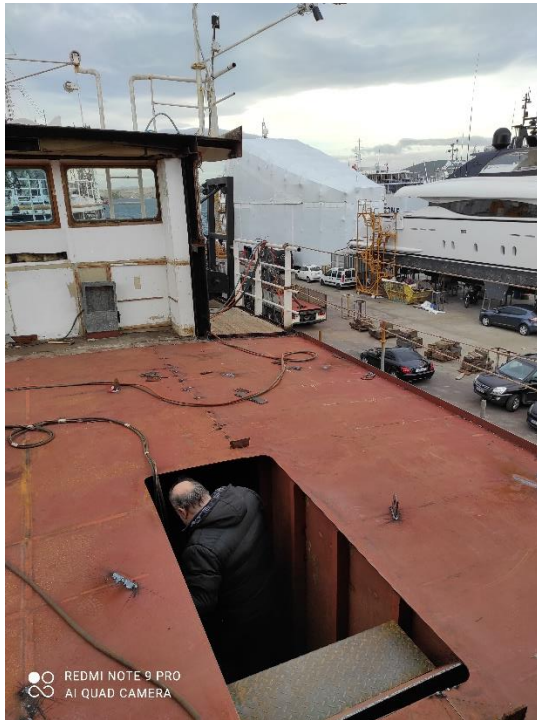

5.- Εσωτερικοί χώροι υπερκατασκευής

Από 26-01-2021 διαμορφώθηκαν οι εσωτερικοί χώροι της υπερκατασκευής του νέου τμήματος.



6.- Γέφυρα και Ηλεκτρονικό εργαστήριο

Από 28-01-2021 μεταφέρθηκαν στο ναυπηγείο ελάσματα και ενισχυτικά των πλευρών της επέκτασης της γεφύρας πάνω από την υπερκατασκευή του νέου τμήματος,



(γ) Εργασίες κάτω από τη γάστρα του πλοίου

Από 26-01-2021 ξεκίνησε η αποκοπή του προφυλακτήρος και δημιουργία βάσεως του νέου ηχοβολιστικού αριστερά.



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

17/02/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Φεβρουαρίου 2021**



Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Φεβρουαρίου 2021

(α) Κατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

Την 02-02-2021, συνεχίστηκε η τοποθέτηση των πλευρικών πλωτήρων (sponsons)

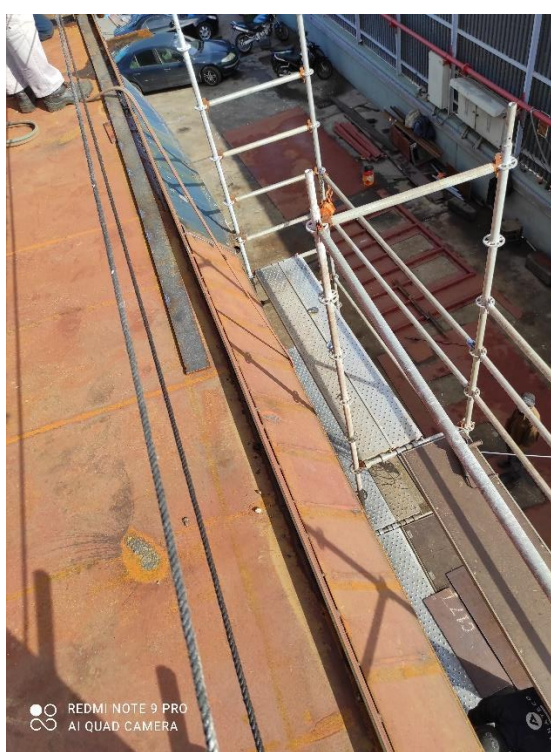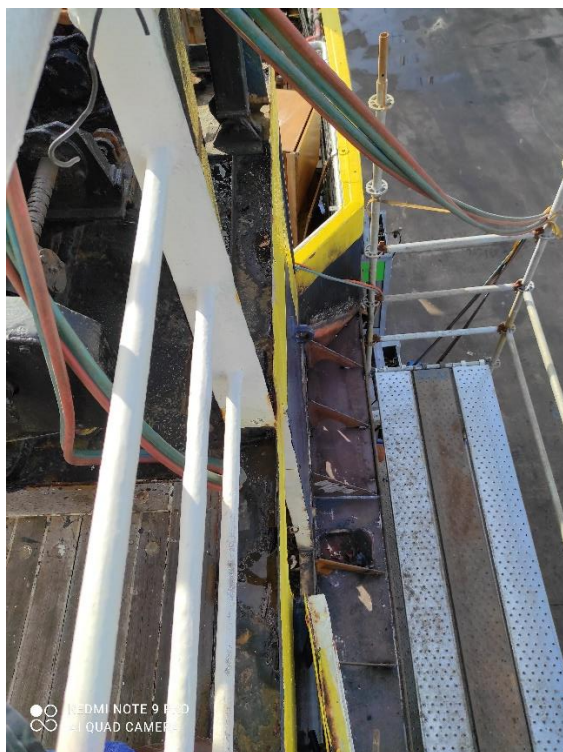


Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456


Ειδικότερα τοποθετήθηκε το άνω κεκλιμένο άκρο των πλωτήρων καθώς και αντικατάσταση τμήματος (πρυμναίο αριστερά) αυτού.

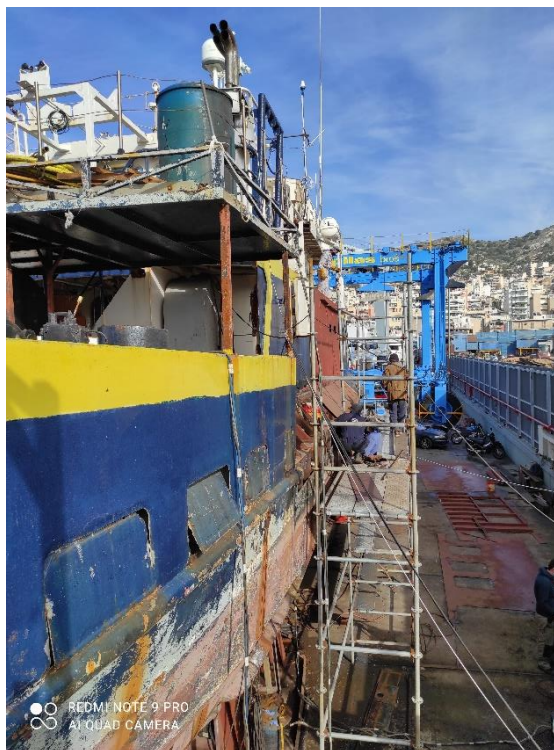

(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα

1.- Γέφυρα

Από 09-02-2021 ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης της κονσόλας οργάνων χειρισμού στην Γέφυρα δια κυβερνήσεως του πλοίου:


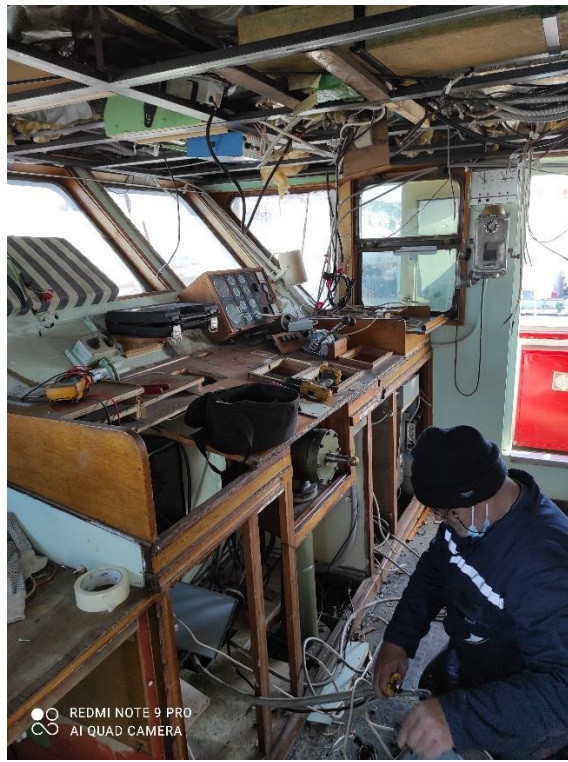


Οι οποίες περατώθηκαν την 11-02-2021.:



2. Ηλεκτρονικό εργαστήριο

Την 11-02-2021 τα ελάσματα με τα ενισχυτικά τους των πλευρών της επέκτασης της γεφύρας πάνω από την υπερκατασκευή του νέου τμήματος ανυψώθηκαν και τοποθετήθηκαν με ανυψωτικό γερανό.

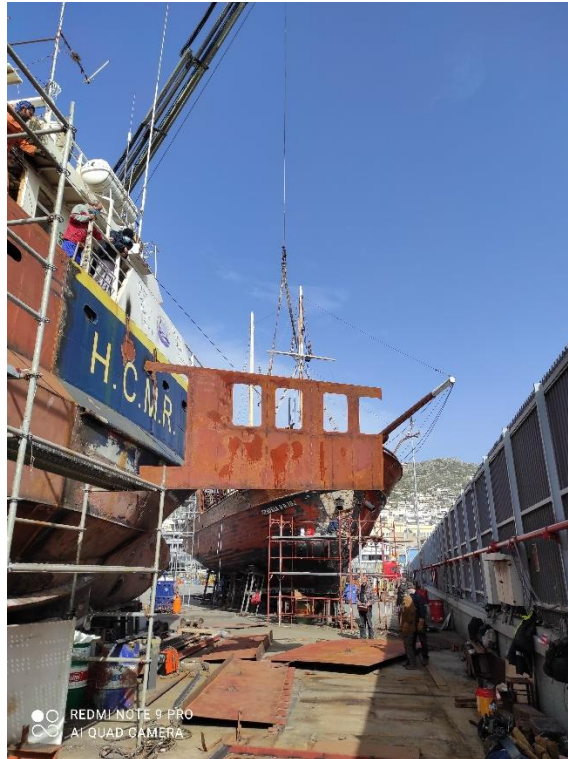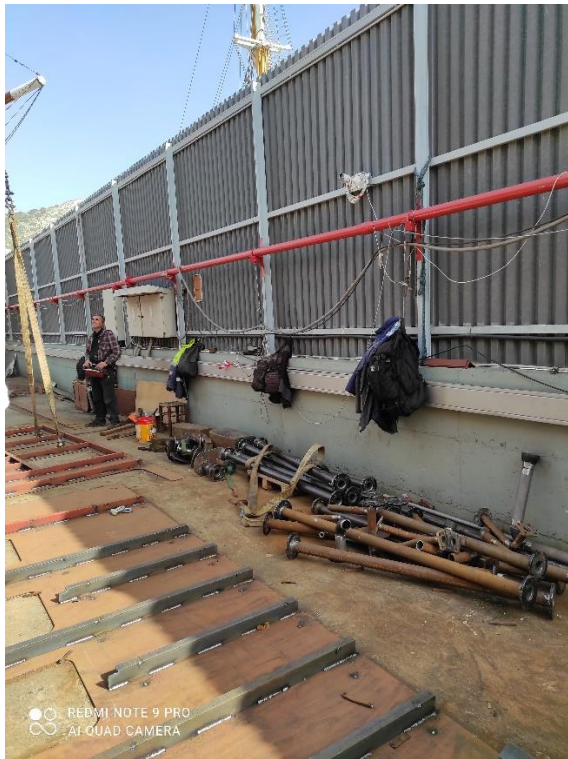



Ma.T.Co. Ltd
 81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece
 phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

(γ) Εργασίες κάτω από το κύριο κατάστρωμα

1. Περιοχή Μηχανοστασίου

Την 09-02-2021 συνεχίζονταν οι εργασίες σωληνώσεων στο πρωραίο (νέο) τμήμα μηχανοστασίου.



Αναμενόταν η τοποθέτηση του νέου Κυρίου Ηλεκτρικού Πίνακα



Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

(δ) Εργασίες κάτω από τη γάστρα του πλοίου

Την 9-02-2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες αποκοπής του προφυλακτήρος και δημιουργία βάσεως του νέου ηχοβολιστικού αριστερά.



(ε) Αγκυρες - Αλυσίδες

Την 9-02-2021 είχαν μεταφερθεί στο ναυπηγείο (προμήθεια από Ναυτική Υπηρεσία ΕΛΚΕΘΕ) τα νέα τμήματα αντικατάστασης και επέκτασης της αλυσσίδας και οι δύο νέες άγκυρες,



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

5/03/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Φεβρουαρίου 2021**



Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Φεβρουαρίου 2021

(α) Κατασκευή νέου τμήματος από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

Την 18-02-2021, ξεκίνησε η διενέργεια παχυμετρήσεων με υπερήχους
(ULTRASONIC) σκάφους που περατώθηκε την 19-02-2021.

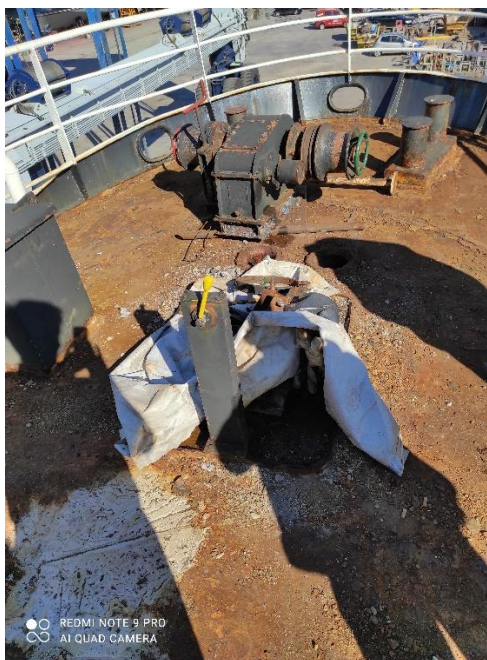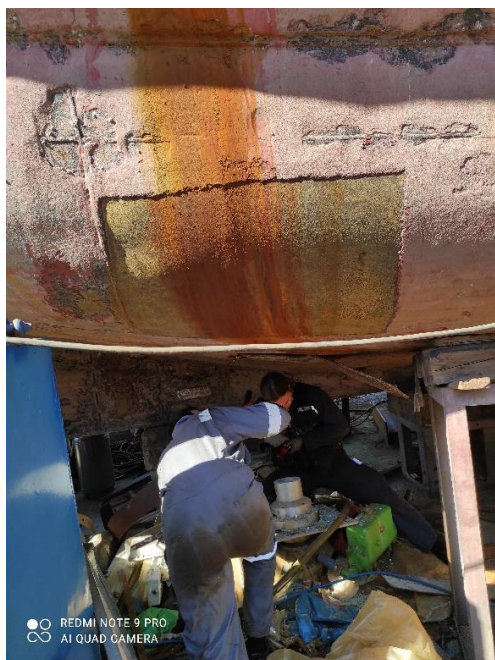

Ma.T.Co. Ltd



81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα

1. Ηλεκτρονικό εργαστήριο

Την 16-02-2021 συμπληρώθηκε η τοποθέτηση και επέκταση των πλευρών και της οροφής του νέου τμήματος του ηλεκτρονικού εργαστηρίου και συνεχίστηκε η συγκόλληση τους με την οροφή της υπερκατασκευής.

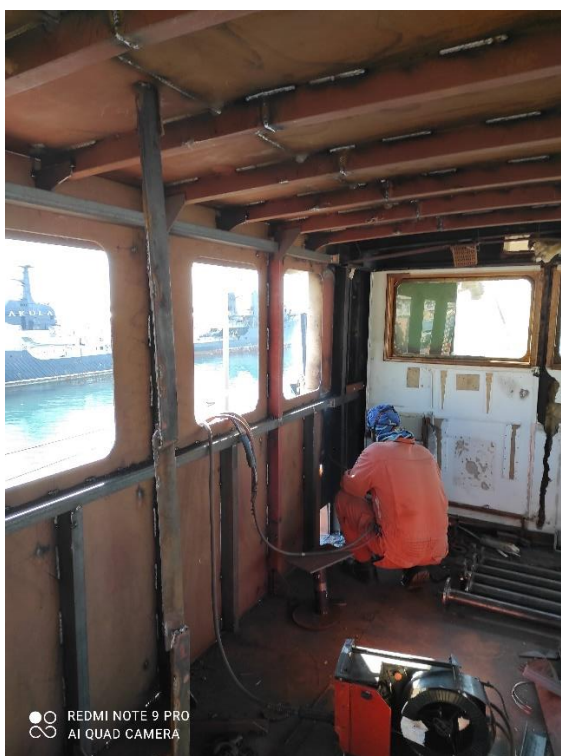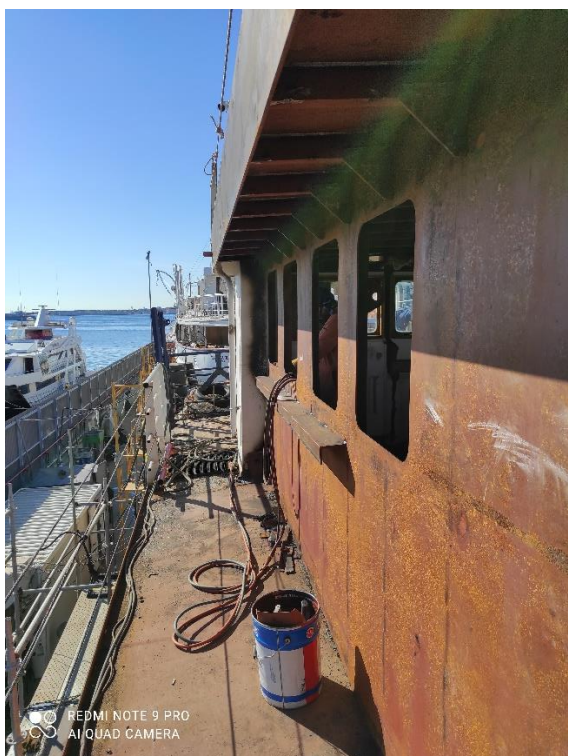





2. Πρωραίο τμήμα καταστρώματος Γεφύρας


Την 18-02-2021 έγινε αποξήλωση του εργάτη αγκύρας και διαπιστώθηκε μεγάλη φθορά στην βάση του με αποτέλεσμα την ανάγκη αντικατάστασης αυτού.





3. Πρυμναίο τμήμα κυρίου καταστρώματος

Την 22-02-2021 ξεκίνησε η αποξήλωση του πρυμναίου τμήματος του καταστρώματος για την αντικατάστασή του με νέο πιο ενισχυμένο (10mm) προς εγκατάσταση του νέου A-Frame.

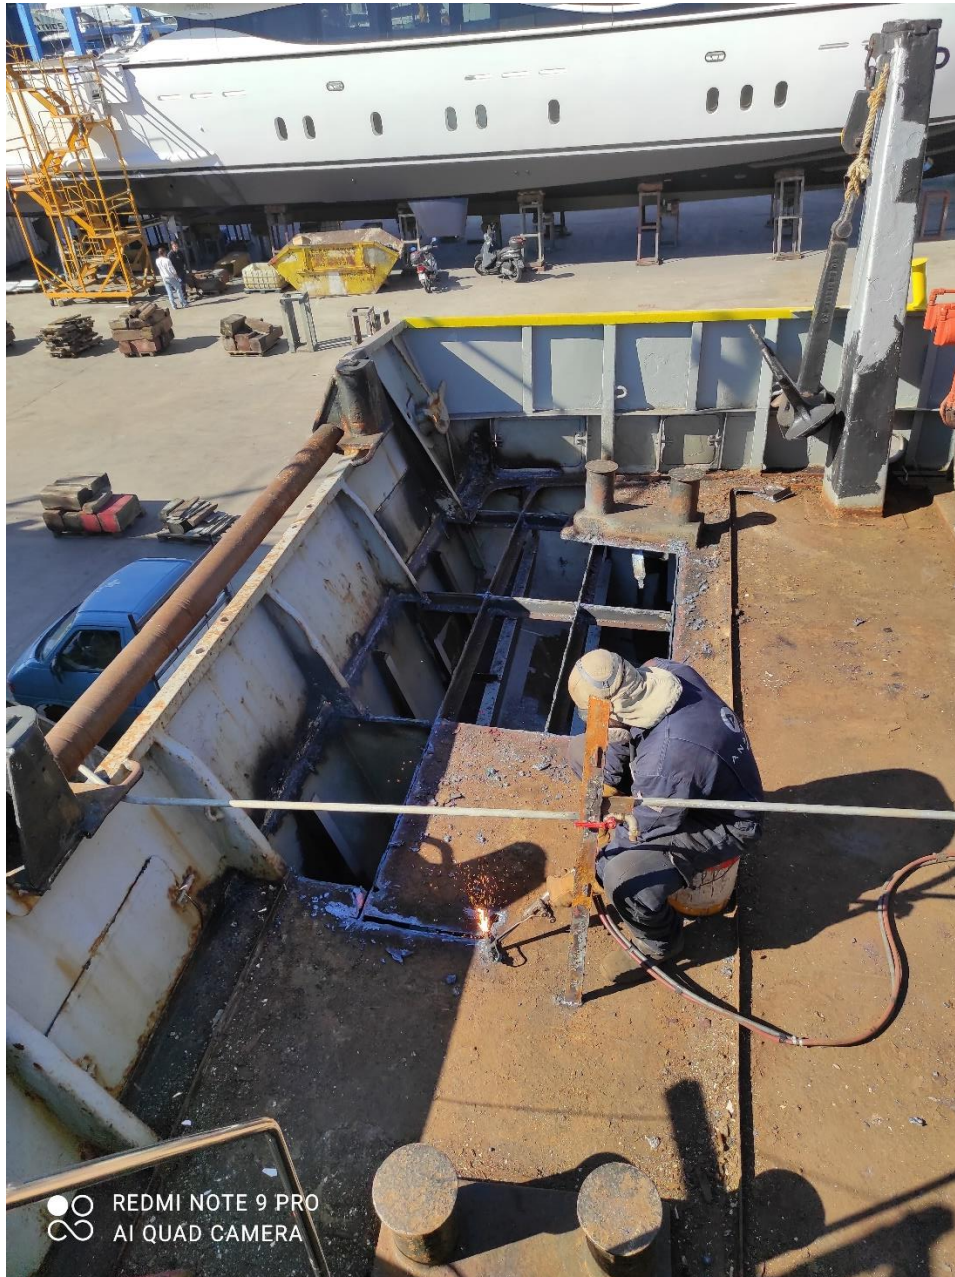

(γ) Εργασίες κάτω από τη γάστρα του πλοίου

1. Βάση ηχοβολιστικού

Την 23-02-2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες αποκοπής του προφυλακτήρος και δημιουργία βάσεως του νέου ηχοβολιστικού αριστερά.




2. Πρωραίος ωθητήρας (Bow Thruster)

Την 23-02-2021 έγινε εξαγωγή προς επιθεώρηση και συντήρηση του πρωραίου ωθητήρα (Bow Thruster)



(δ) Αγκυρες - Αλυσίδες

Έγιναν λεπτομερείς μετρήσεις διαστάσεων κλειδιού συνδέσεως προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάμετρος των νέων σωλήνων αγκυρών και αλυσίδων (όκια) που θα εγκατασταθούν στο πλοίο.

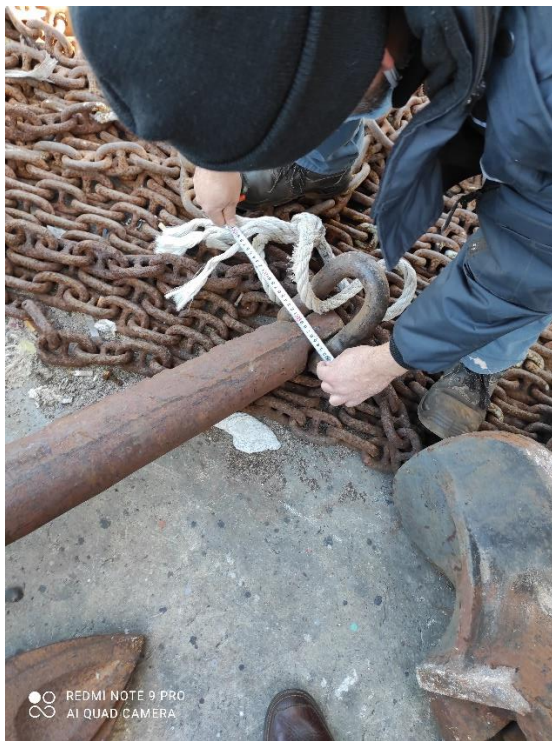

Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

16/03/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Μαρτίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Μαρτίου 2021

(α) Από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

1. Διάνοιξη και κατασκευή αριστερού BLISTER (1-3-2021)




Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456



2. Αφαίρεση Πηδαλίων (προς επιθεώρηση)

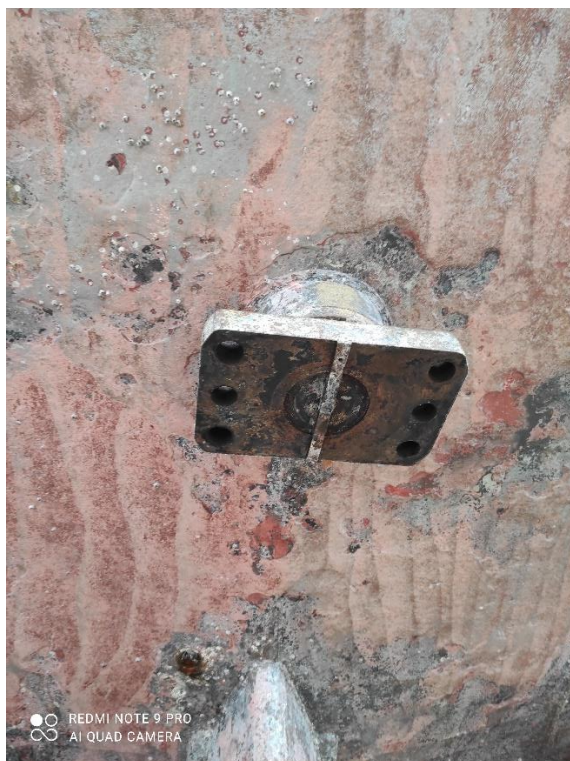

3. Αφαίρεση και συντήρηση πωραίου ωθητήρα (Bow thruster)



(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα

1. Ηλεκτρονικό εργαστήριο


Ξεκίνησε (2-3-2021) η τοποθέτηση των οδηγών καλωδιώσεων στο χώρο του ηλεκτρονικού εργαστηρίου.






2. Πρωραίο τμήμα καταστρώματος Γεφύρας

Συνεχίστηκε η αποξήλωση του πρωραίου εργάτη και η μετατόπιση αυτού πρωραίως.

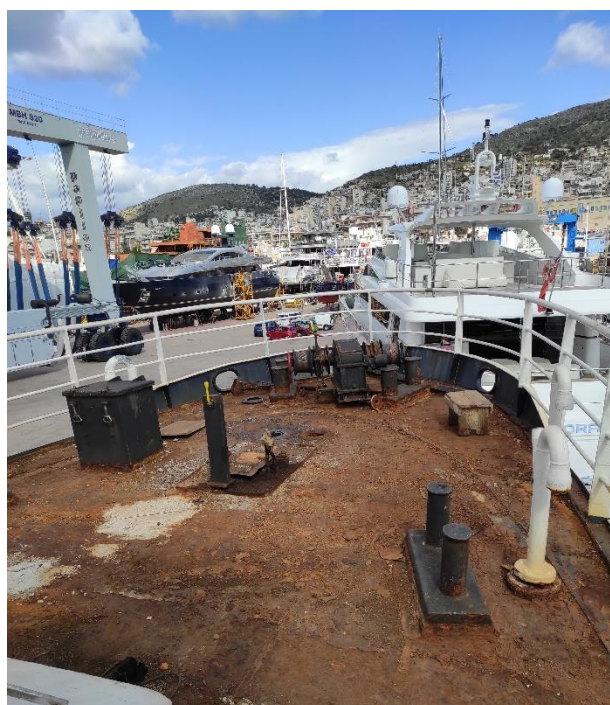

3. Πρυμναίο τμήμα κυρίου καταστρώματος

Την 3-3-2021 συνεχίστηκε η αποξήλωση του πρυμναίου τμήματος του καταστρώματος για την αντικατάσταση του ελάσματος με νέο πιο ενισχυμένο (10mm) προς εγκατάσταση του νέου A-Frame.

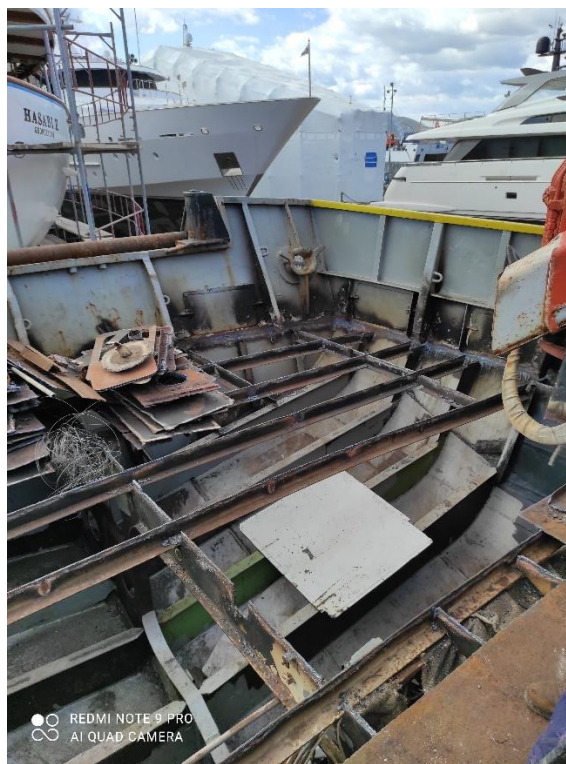

Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

31/03/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Μαρτίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Μαρτίου 2021

(α) Από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

1. Πλευρική αντικατάσταση ελασμάτων δεξιάς πλευράς λόγω διαβρώσεως



Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

2. Νέο τμήμα

Σωλήνες σεντινών αριστερής πλευράς



●○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA



3. Τοποθέτηση προστατευτικού σωλήνα (Fender) Δεξιά και Αριστερά





4. Αφαίρεση και συντήρηση προωραίου ωθητήρα (Bow thruster)



5. Πρυμναίος Ωθητήρας (stern thruster)

Εύρεση θέσεως προς χάραξη



Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

(β) Εργασίες πάνω από το κύριο κατάστρωμα

1. Ηλεκτρονικό εργαστήριο

Τοποθέτηση αεραγωγών



Εγκατάσταση πλαισίων (Frames) Παραθύρων
στο χώρο του ηλεκτρονικού εργαστηρίου.



