

Αντικατάσταση φθαρμένου ελάσματος καταστρώματος (Έμπροσθεν εισόδου υπερκατασκευής)



Αντικατάσταση φθαρμένου ελάσματος καταστρώματος (Δεξιά)



Δεξαμενή Ημερησίας κατανάλωσης (θα τοποθετηθεί στο Μηχανοστάσιο)



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. ltd](mailto:napoleonpt@gmail.com)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

3/05/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Απριλίου 2021**

Κύριοι


Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Απριλίου 2021

(α) Από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

1.Πρυμναίος Ωθητήρας (stern thruster)

Συγκόλληση χοάνης ωθητήρος στο ποδόσταμο (Skeg)

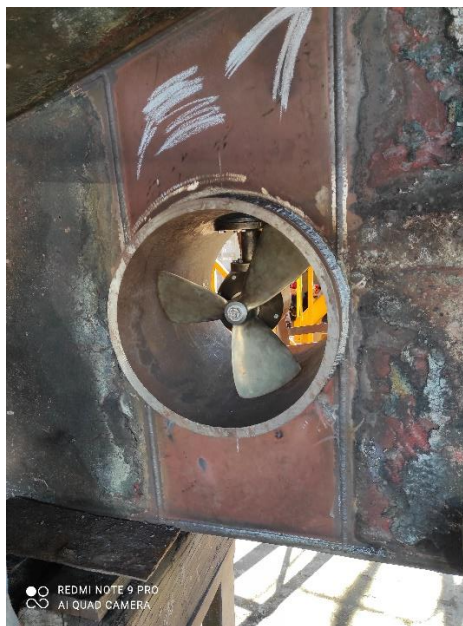

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456


2. Προετοιμασία για καθαρισμό γάστρας με υδροβολή (αντλία 2500bar)



αντλία 2500bar



3. Την 22-04-2021 ξεκίνησε υδροβολή γάστρας στα 2300bar περίπου

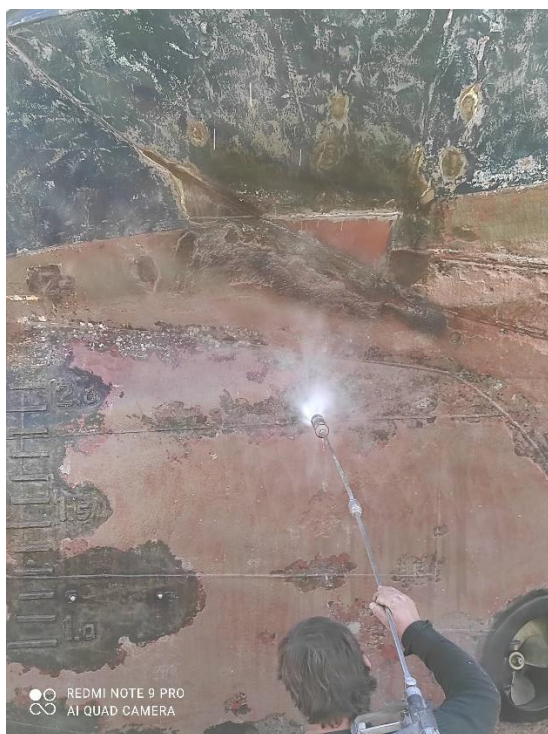

Και επακολούθησε βαφή με αρχικό χρώμα (μίνιο) στις ραφές και σε όλο το νέο τμήμα





Όπως απεδείχθη ο καθαρισμός ενώ είχε βγάλει ένα μεγάλο μέρος των κατεστραμμένων χρωμάτων είχε αφήσει αρκετές περιοχές που έχρηζαν καθαρισμού

και λείανσης (με τροχό) και γι' αυτό η συνέχιση του χρωματισμού ανεστάλη.
(Συνεχίστηκε μόνο στην περιοχή του νέου τμήματος με δεύτερο χέρι μίνιο-κόκκινο)

4. Μετατόπιση πλοίου σε άλλη θέση του ναυπηγείου.



Την 29-04-2021 το ναυπηγείο αποφάσισε την μετατόπιση του πλοίου στην απέναντι θέση





REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



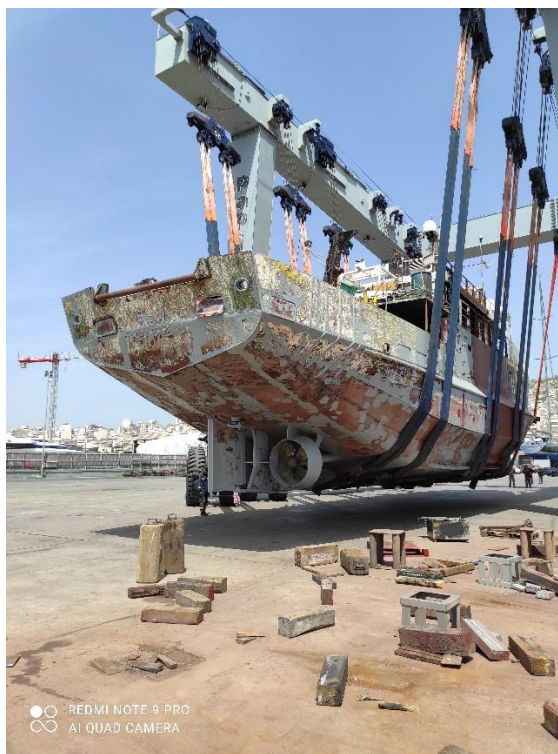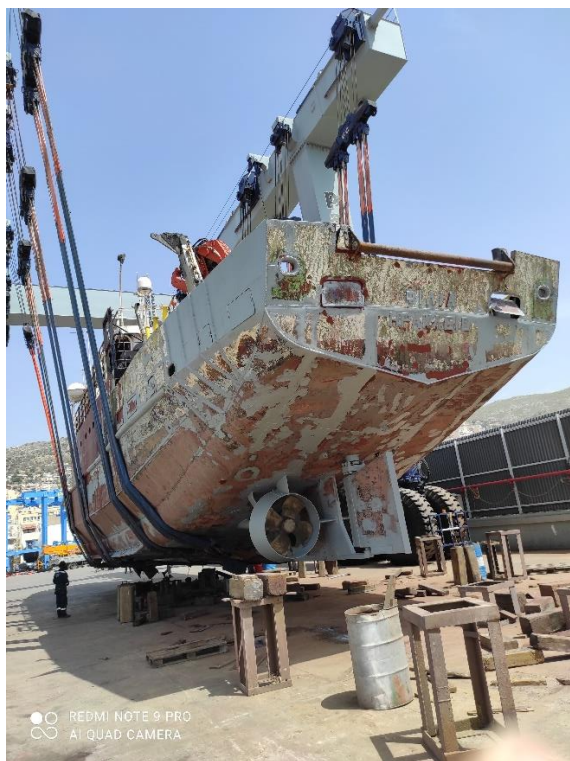

Ma.T.Co. Ltd
81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece
phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456



Ma.T.Co. Ltd
81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece
phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

15/05/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Μαΐου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Μαΐου 2021

(α) Από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα

1.Πρυμναίος Ωθητήρας (stern thruster)

(07-05-2021) Προκατασκευή προφυλακτήρων στον πρυμναίο



Ma.T.Co. Ltd


81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456



2. Επιδιόρθωση περιοχών που δεν είχαν καθαρισθεί από την υδροβολή

Ξεκίνησε ο καθαρισμός και λείανση (με τροχό) περιοχών που δεν είχαν καθαρισθεί από την υδροβολή.

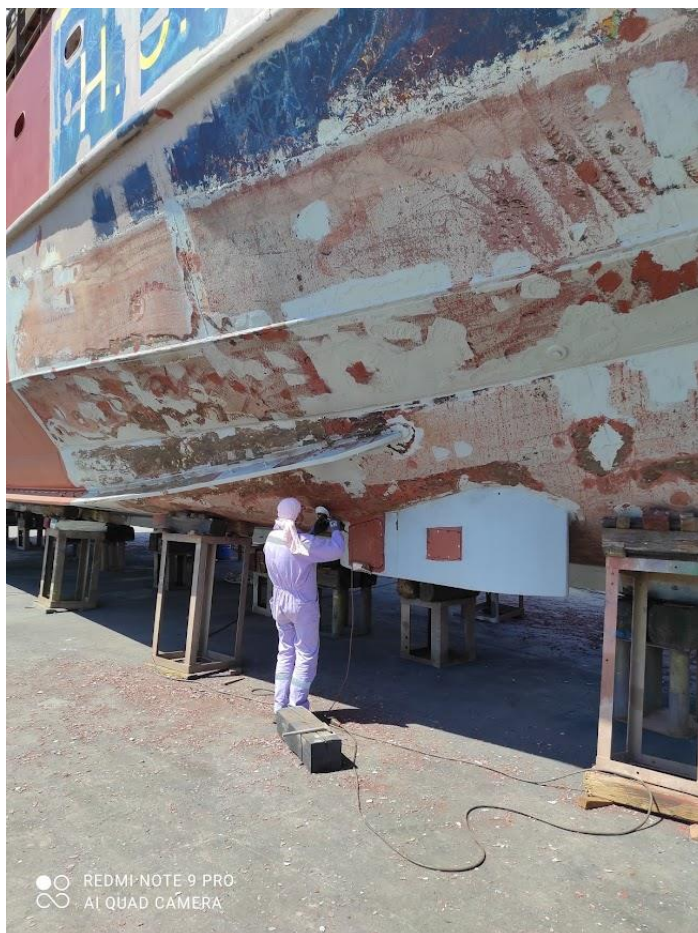

Ma.T.Co. Ltd
81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece
phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

β. Πρυμναίο τμήμα κυρίου καταστρώματος



Έχουν τελειώσει οι εργασίες αποξήλωσης του πρυμναίου τμήματος του καταστρώματος για την αντικατάσταση του ελάσματος και η τοποθέτηση και συμπλήρωση των ενισχυτικών.




Προσκόμιση νέου ενισχυμένου ελάσματος (12 mm)




Έναρξη τοποθέτησης νέου ελάσματος καταστρώματος πρύμνης

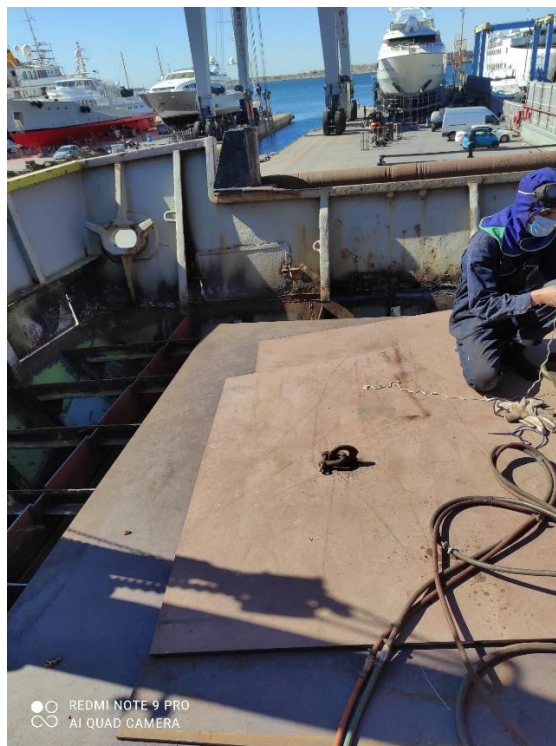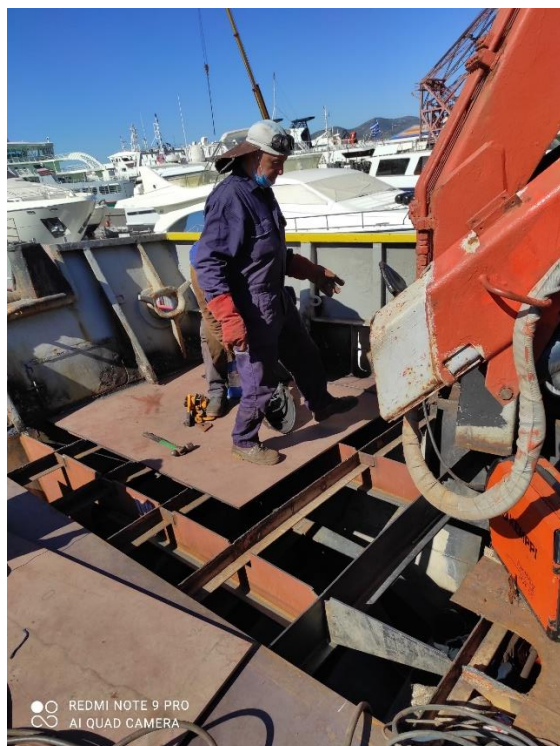

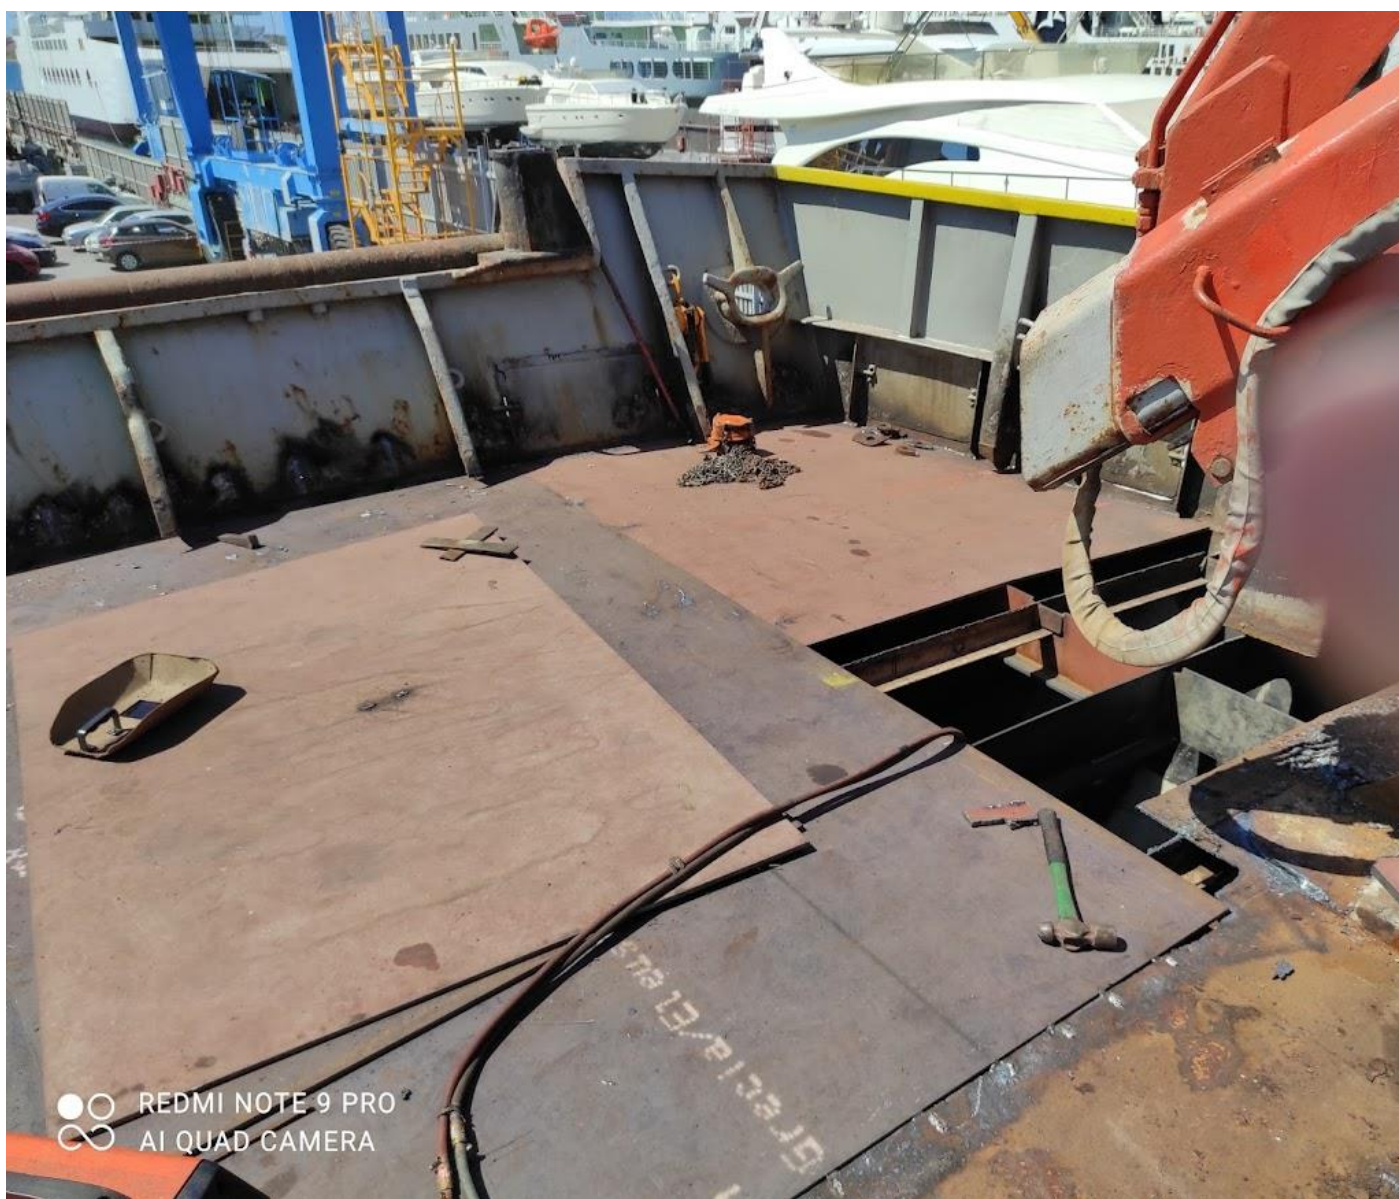


Πλευρές Νέου τμήματος

Τοποθετήθηκαν οι δίσκοι γραμμής φορτώσεως Δεξιά και Αριστερά.

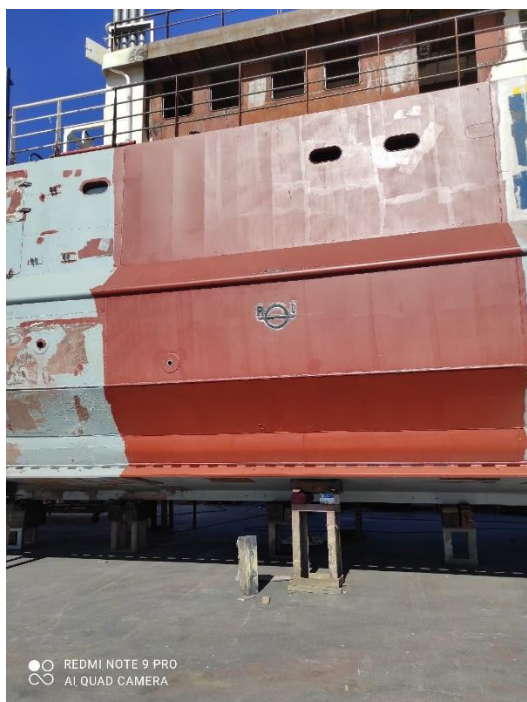

4. Προσκόμιση της κεντρικής μονάδας κλιματισμού

Την 11-05-2021 έγινε προσκόμιση της κεντρικής μονάδας κλιματισμού το ναυπηγείο.

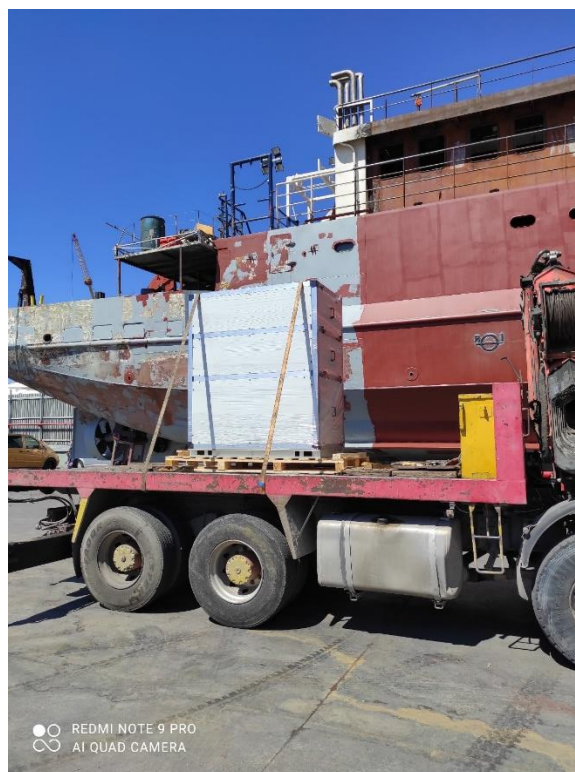



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

31/05/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Μαΐου 2021**


Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Μαΐου 2021

(α) Από πυθμένα έως κύριο κατάστρωμα


Καθαρισμοί γάστρας

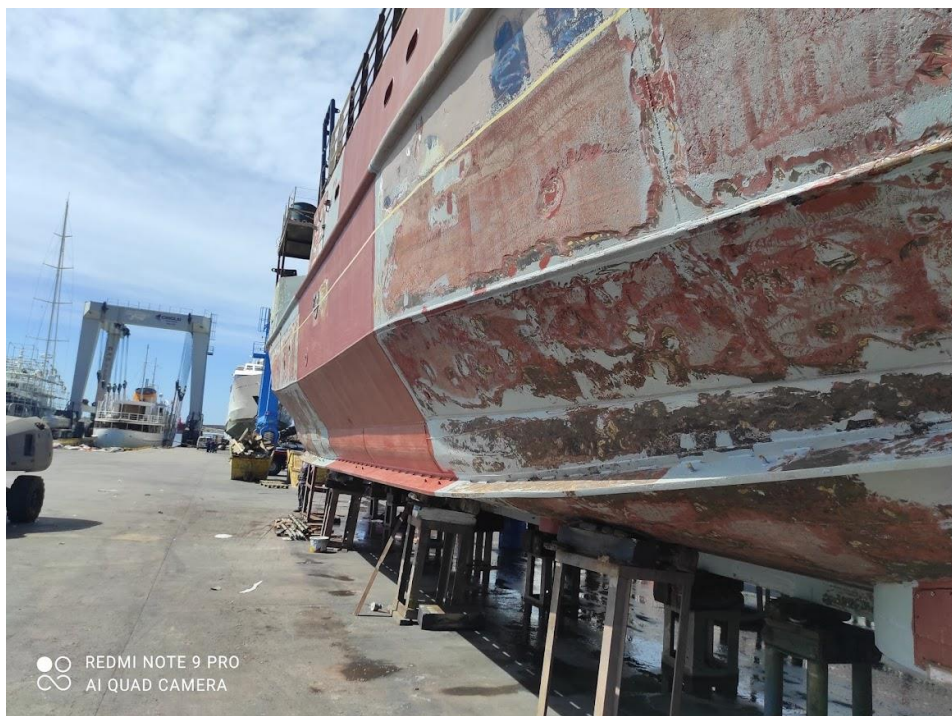

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece



phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

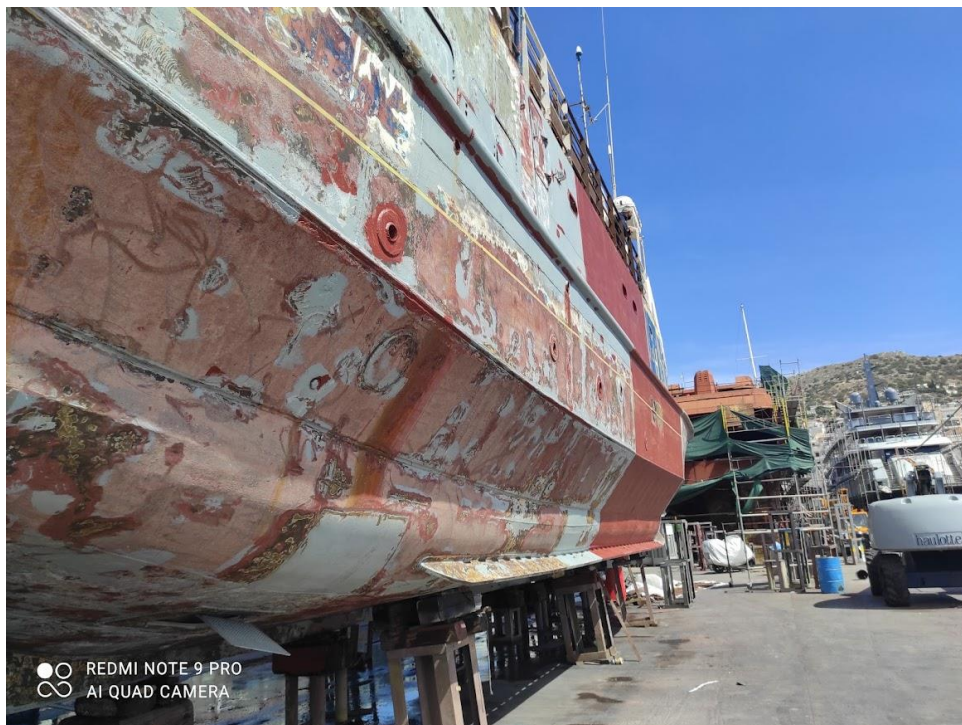

β. Πρυμναίο τμήμα κυρίου καταστρώματος

Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες τοποθέτησης νέου ενισχυμένου ελάσματος (12 mm) καταστρώματος



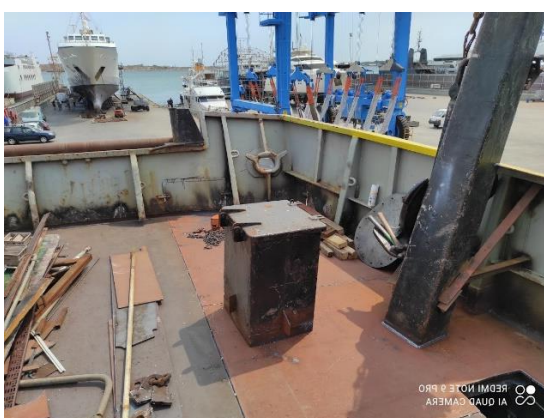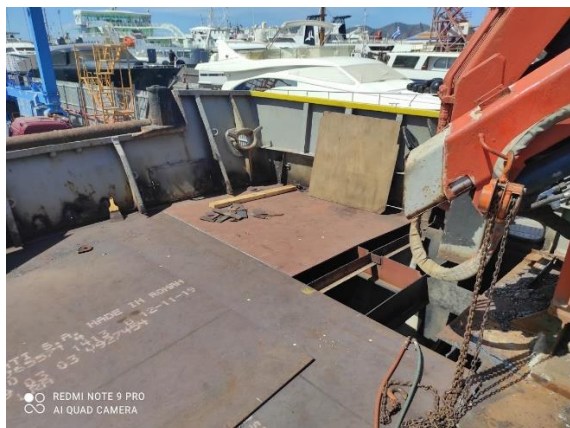


(γ) Υπερκατασκευή Άνω κυρίου καταστρώματος

Χώρος υγρού εργαστηρίου (αριστερά)



Τοποθέτηση αεραγωγών κλιματισμού

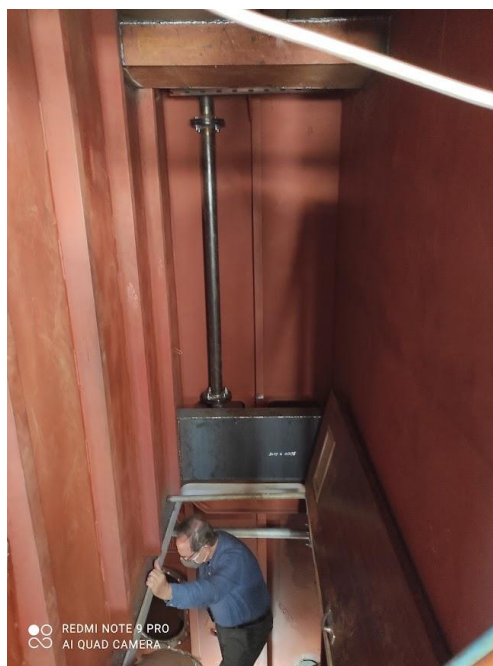

Τουαλέτα πρυμναίου καταστρώματος





Εξωτερική πλευρά ηλεκτρονικού εργαστηρίου



(δ) Πρωραίο κατάστρωμα



Έκταση αλυσίδων αγκυρών

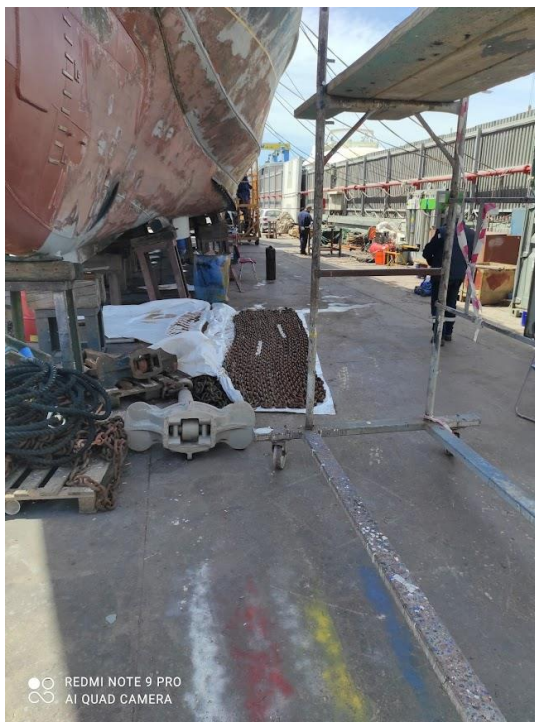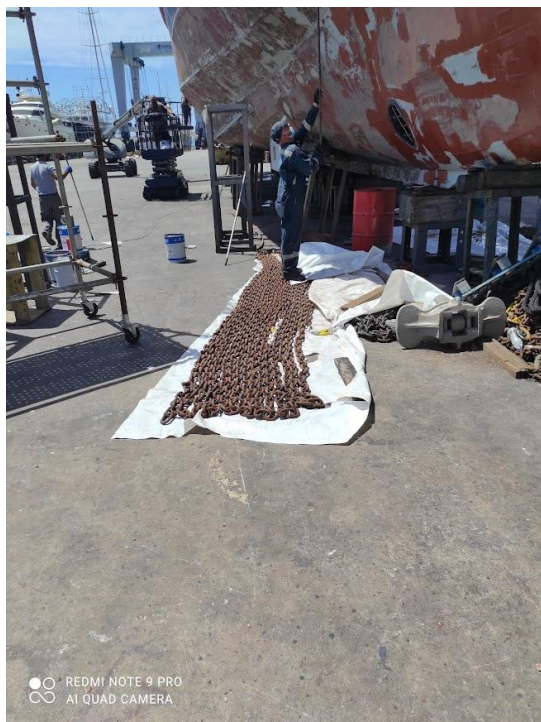



8





Ma.T.Co. Ltd
81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece
phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456



Καθέλκυση πλοίου (28 Μαΐου 2021)



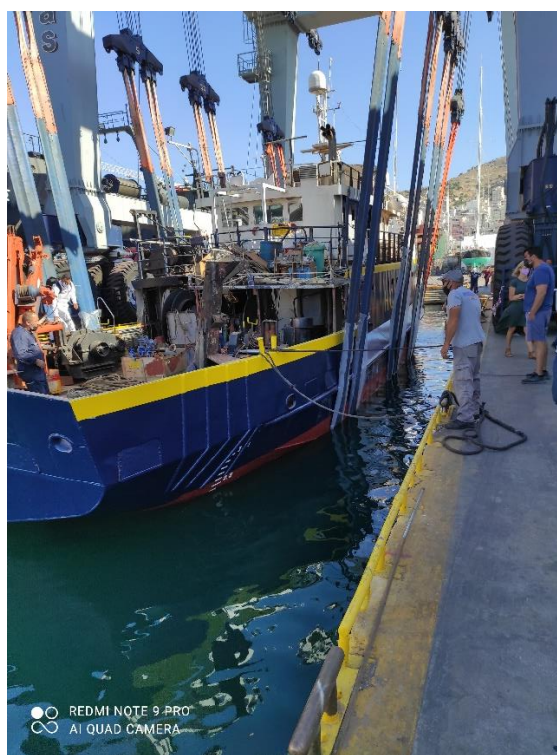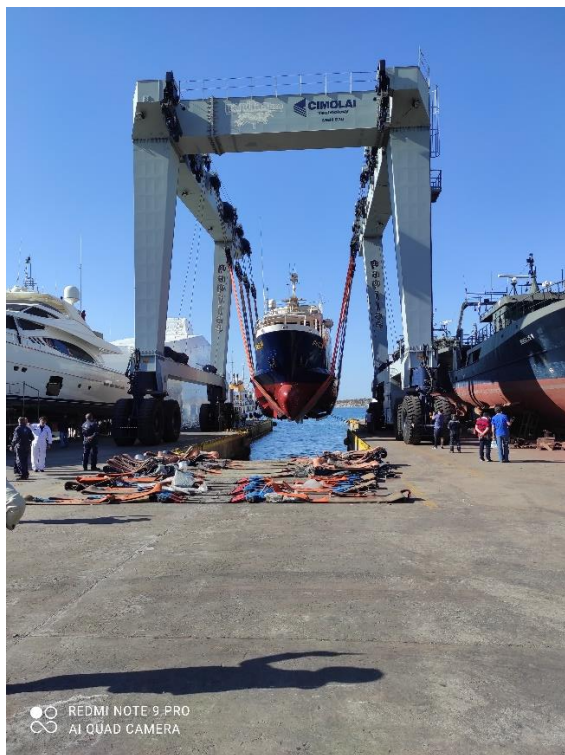

Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](#)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

15/06/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη**

Δρ. Αθανασίου Μαχιά

**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (1) πρώτου 15 ημέρου
μηνός Ιουνίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (1) πρώτου 15ημερου Ιουνίου 2021

(α) Πρόσδεση σε νέα θέση πρυμναίως

Μετά την καθέλκυση του το πλοίο προσδέθηκε με την πρύμνη προς συνέχιση των
εργασιών.




Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Β) μεταφορά μονίμου έρματος στο νέο τμήμα

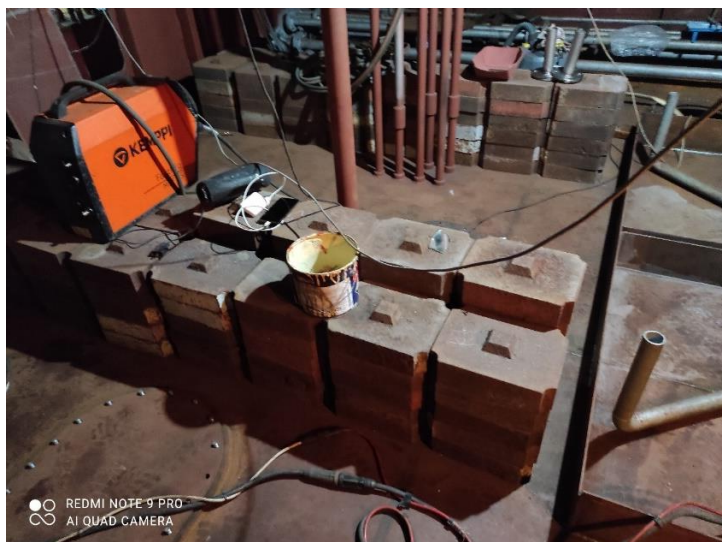

Γ) Προμήθεια βαλβίδων για τις σωληνώσεις μηχανοστασίου

Επί του πυρμναίου καταστρώματος




Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456


Δ) Τμήμα αεραγωγών στο ηλεκτρονικό εργαστήριο Γεφύρας

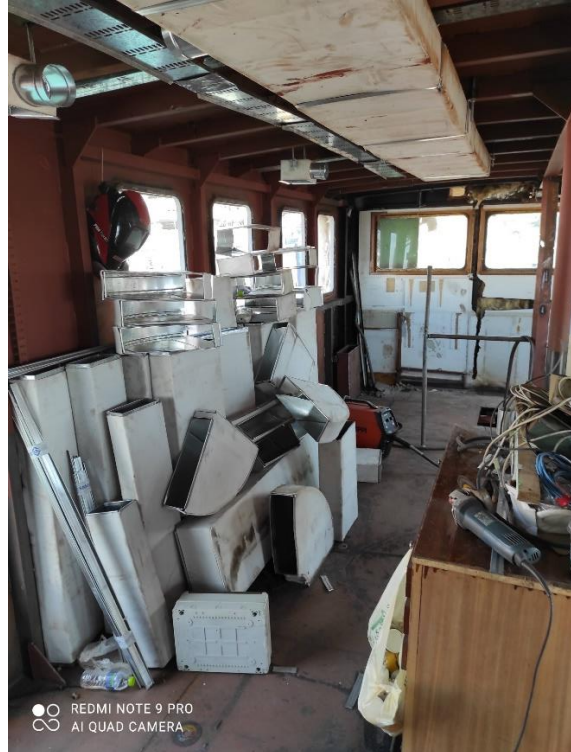

Ε) Εγκατάσταση Ναυτιλιακών οργάνων στη Γέφυρα




Ε) Νέα ημερήσια δεξαμενή καυσίμου για το μηχανοστάσιο

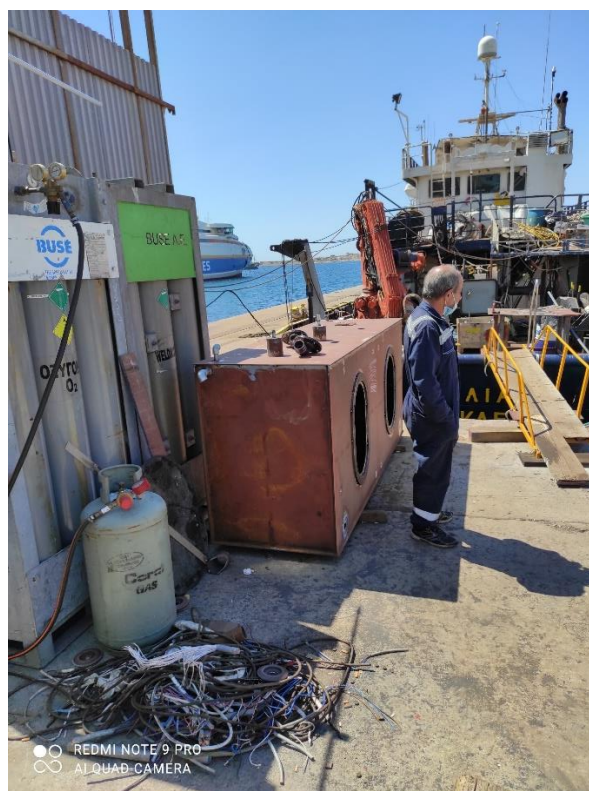


ΣΤ) Εφαρμογή μονώσεων

Θερμομόνωση υπό το κατάστρωμα στους νέους χώρους

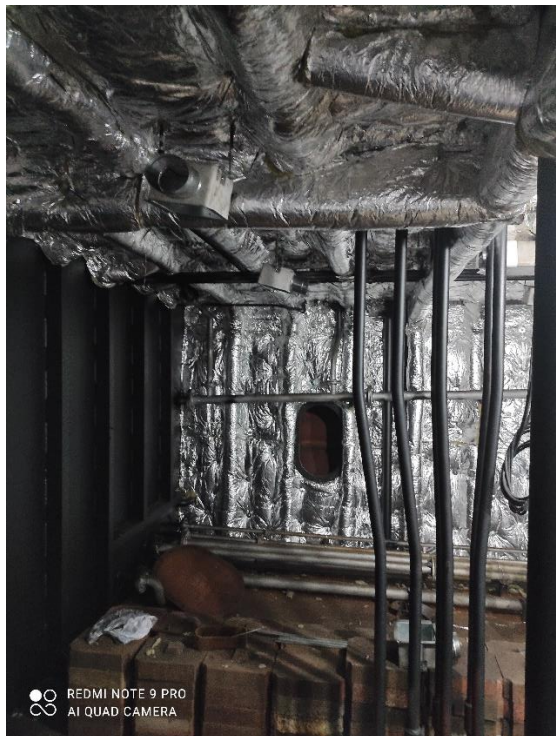

Μόνωση πυρασφαλείας (κουζίνα) (8-Ιουνίου 2021)

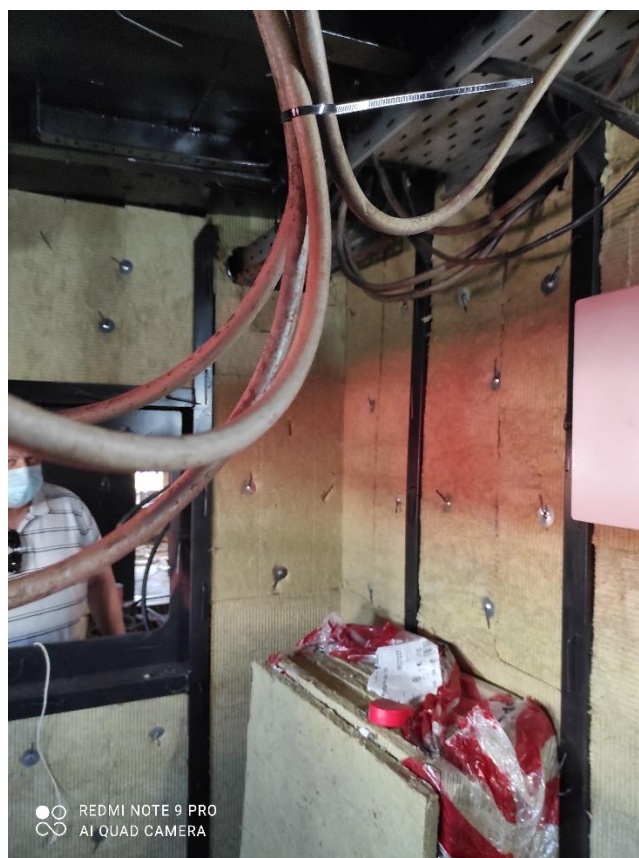

Μόνωση πυρασφαλείας και θερμομόνωση (κουζίνα) (8-Ιουνίου 2021)



Εφαρμογή μονώσεων (15-Ιουνίου 2021)

Διάδρομος εισόδου κυρίου καταστρώματος



Χώρος υγρού εργαστηρίου



Χώρος τραπεζαρίας



Με εκτίμηση

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

[Ma.T.Co. Ltd](mailto:napoleonpt@gmail.com)

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

e-mail napoleonpt@gmail.com

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

Από: **ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ**

Πειραιάς

30/06/2021

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ. Όψη: καθ. Εμμ. Σαμουηλίδη

Δρ. Αθανασίου Μαχιά


**Θέμα: C6401C // ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Ενημέρωση (2) δευτέρου 15 ημέρου
μηνός Ιουνίου 2021**

Κύριοι

Αναφερόμενοι στο έργο της Μετασκευής του πλοίου «ΦΙΛΙΑ» Νηολ. Ηρακλείου 12, RINA
No 97887, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Εργασίες Μετασκευής εντός του (2) δευτέρου 15ημερου Ιουνίου 2021

(α) Προσκόμιση κεφαλών εξαεριστικών και λέβητος

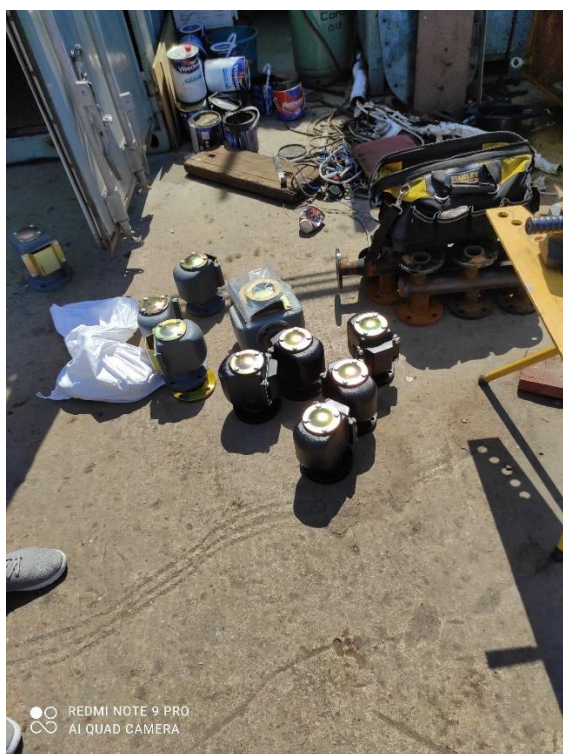

Ma.T.Co. Ltd

81 Ir. Polytechniou av. 185 36 Piraeus, Greece

phone: +30 210 4185475-6, mob. +30 6932582456

(β) Εφαρμογή στρώματος τσιμέντου στην οροφή διπυθμένου και καταστρωμάτων
Χώροι νέας κατασκευής




(γ) Χώρος Μηχανοστασίου



Εσωτερική μόνωση πυρασφαλείας



Ηλεκτρικός Πίνακας και Μετασχηματιστές

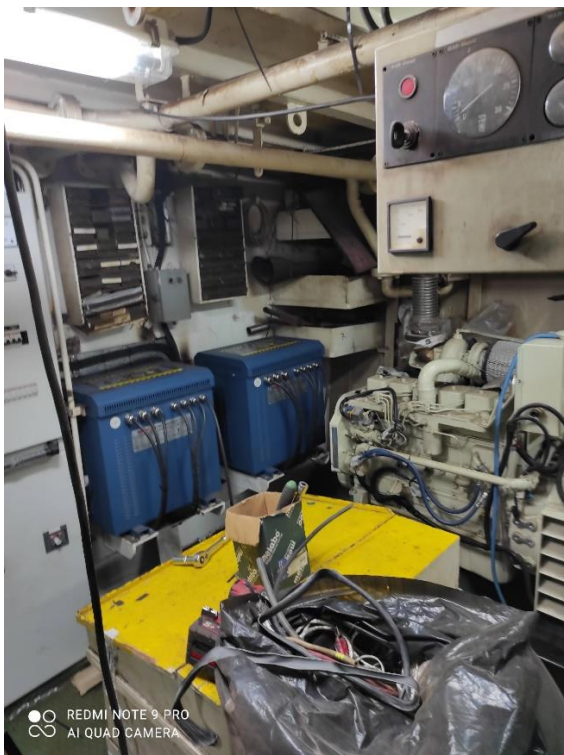

(δ) Προσκόμιση πλευρικών επενδύσεων -Pannels (24- Ιουνίου-2021)

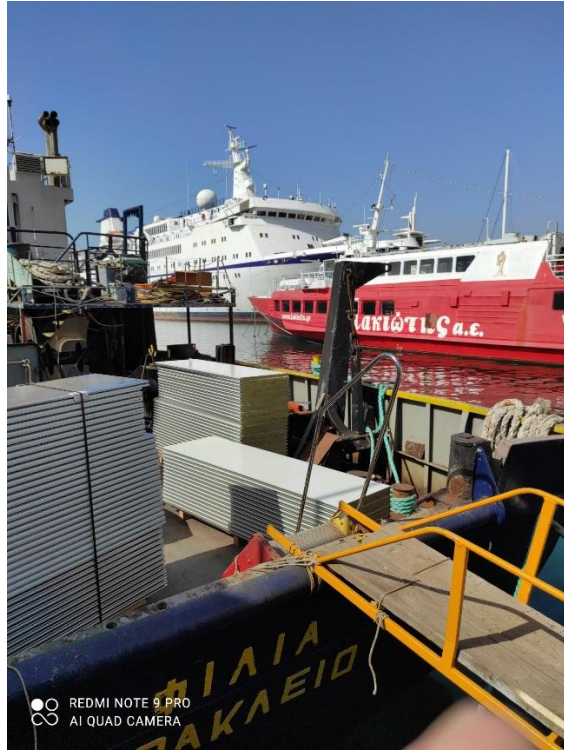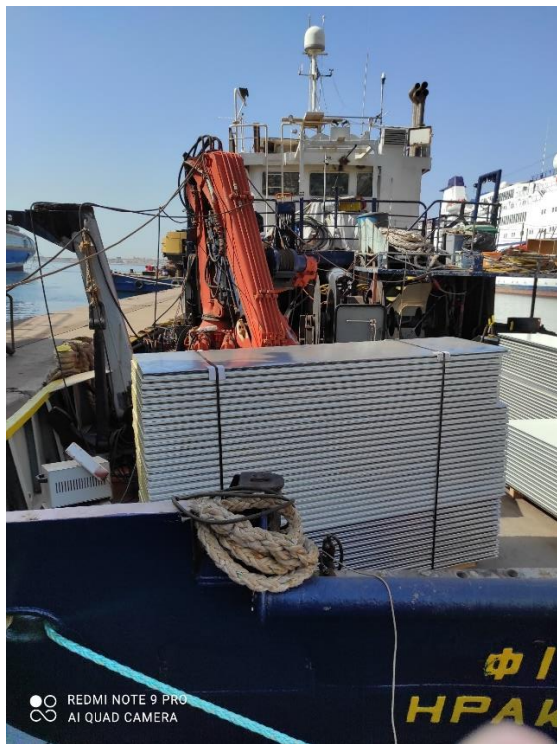

(ε) Εφαρμογή Pannels

Υγρό εργαστήριο





(στ) Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Γεφύρας (επίστρωση δαπέδου)

